




Raccordement du parc éolien en mer de Saint-Nazaire

– Instance de Concertation et de suivi – 1^{er} juillet 2022



Projet de raccordement de Saint Nazaire

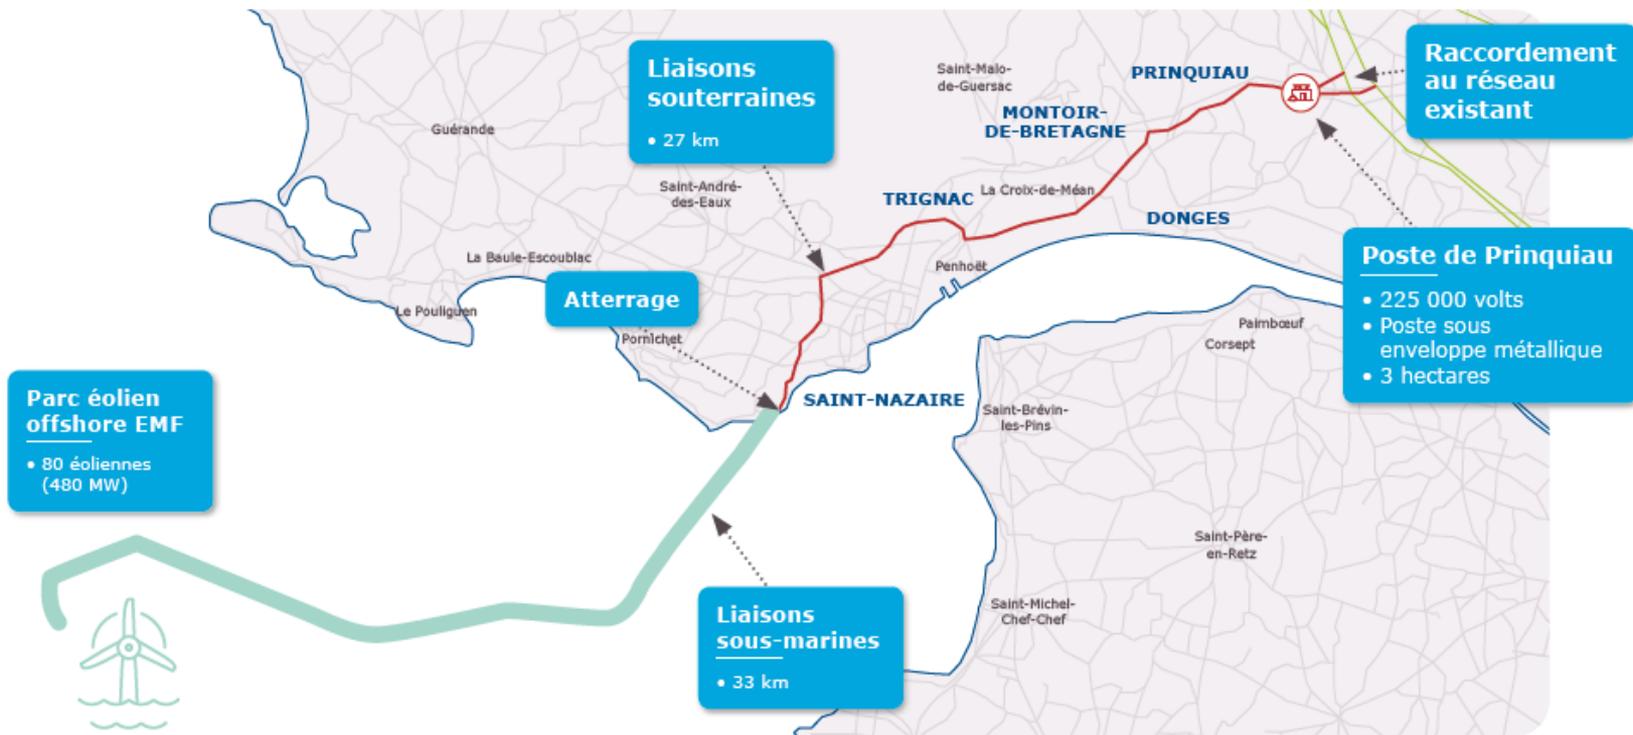




Avancement du projet

- Mise à disposition de la liaison 1 du raccordement le 12 avril 2022 => possibilité pour le parc de produire une puissance jusqu'à 252 MW
- Mise à disposition de la liaison 2 du raccordement estimée à mi-juillet 2022 sous réserve des essais restant à réaliser
- Finalisation des opérations d'aménagement des abords du poste de Prinquiau
- Contractualisation des suivis environnementaux de la phase d'exploitation (parties maritimes et terrestre)





Les opérations maritimes 2022 – liaison 2

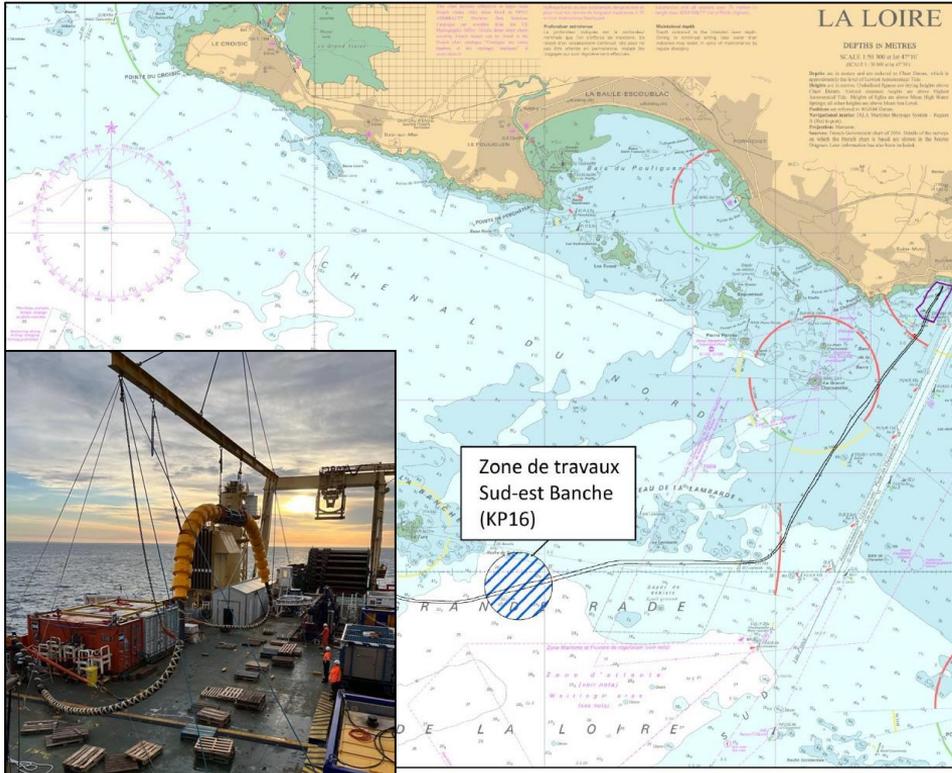

Remplacement de deux jonctions de réparation réalisées en 2021

- Réalisation des travaux en mer de mi-Mars au 09 Juin 2022
- Restrictions aux usages (pêches et mouillage cercle de 0.5 MN de rayon centré sur "KP 16" : 47° 09.78'N - 002° 25.34'O

Succès de la réparation confirmé par un test HVAC le 2 juin 2022

Echéance prévisionnelle de mise à disposition de la liaison 2 mi-juillet 2022



Merci
